

Gestão de Projetos com Scrum

Rodrigo Martins Pagliares
pagliares@bcc.unifal-mg.edu.br

Agenda

Parte 0: Apresentação

Parte 1: Introdução aos Métodos Ágeis

Parte 2: Conceitos Fundamentais

Parte 3: O Coração e a Alma do Scrum

Parte 4: Perguntas Frequentes

Parte 6: Referências

Parte 7: Simulado

Apresentação

Introdução aos Métodos Ágeis

Mini-Agenda

1. O que é desenvolvimento ágil de software?
2. Abordagem Tradicional – “Cascata”
3. Abordagem Ágil – “Espiral”
4. O Manifesto Ágil
5. Surgimento dos métodos ágeis
6. Conceitos similares entre os métodos ágeis
7. Exemplos de métodos ágeis
8. O Scrum no Brasil

O que é desenvolvimento ágil de software?



Abordagem Tradicional – “Cascata”



**Problema: Grande risco de não entregar software
Continuamente para reduzir as incertezas.**

Abordagem Ágil – “Espiral”

Implantaç
ão

Implantaç
ão

Implantaç
ão



O Manifesto Ágil

- Resultado do encontro de 17 grandes pensadores do desenvolvimento de software
- Ocorrido em fevereiro de 2001, Utah – EUA
- Martin Fowler, Ken Schwaber, Robert C. Martin, Kent Beck, Alistair Cockburn, Warn Cunningham, Jim HighSmith, Ron Jeffries, Jon Kern, Steve Mellor, Jeff Sutherland, dentre outros.

O Manifesto Ágil

Pessoas e interações

Processos e Ferramentas

Software funcionando

Documentação extensa

**Relacionamento com o
cliente**

Negociação de contrato

Resposta à mudanças

Seguir o planejamento

O Manifesto Ágil

- Ken Schwaber apresentou um conjunto de práticas para a gestão de projetos de software altamente **focada em objetivos**
- **SCRUM** é um método ágil e leve para planejamento e acompanhamento de um projeto.

O Manifesto Ágil

- O SCRUM:
 - Não especifica os detalhes de como é feita a engenharia de software.
 - Usa práticas iterativas e incrementais já fundamentadas no XP – **Extreme Programming**
- Compatível com os padrões **CMMI** e **PMBOK**

Muitos dos
métodos ágeis,
como o SCRUM,
já estavam em
estudo desde os
anos 80.

A maioria dos
métodos ágeis
possui conceitos
similares.

Desenvolvimento Iterativo





Criar o modelo do domínio



Criar a Tela de cadastro de cliente



Implementar o componente de integração com o banco de dados

Trabalho a partir de **listas** de tarefas

Desenvolver uma
Pequena
Funcionalidade
por vez



Ritmo Sustentável



Equipes Multi- Funcionais e Auto Organizáveis





Confiança na
equipe

Entregas Prontas para Produção





Testes e Builds
Automatizados
(Integração Contínua).

Aceitação de Mudanças



Inspeção e Adaptação




SCRUM

XP

Métodos Ágeis

Lean

(*)DD

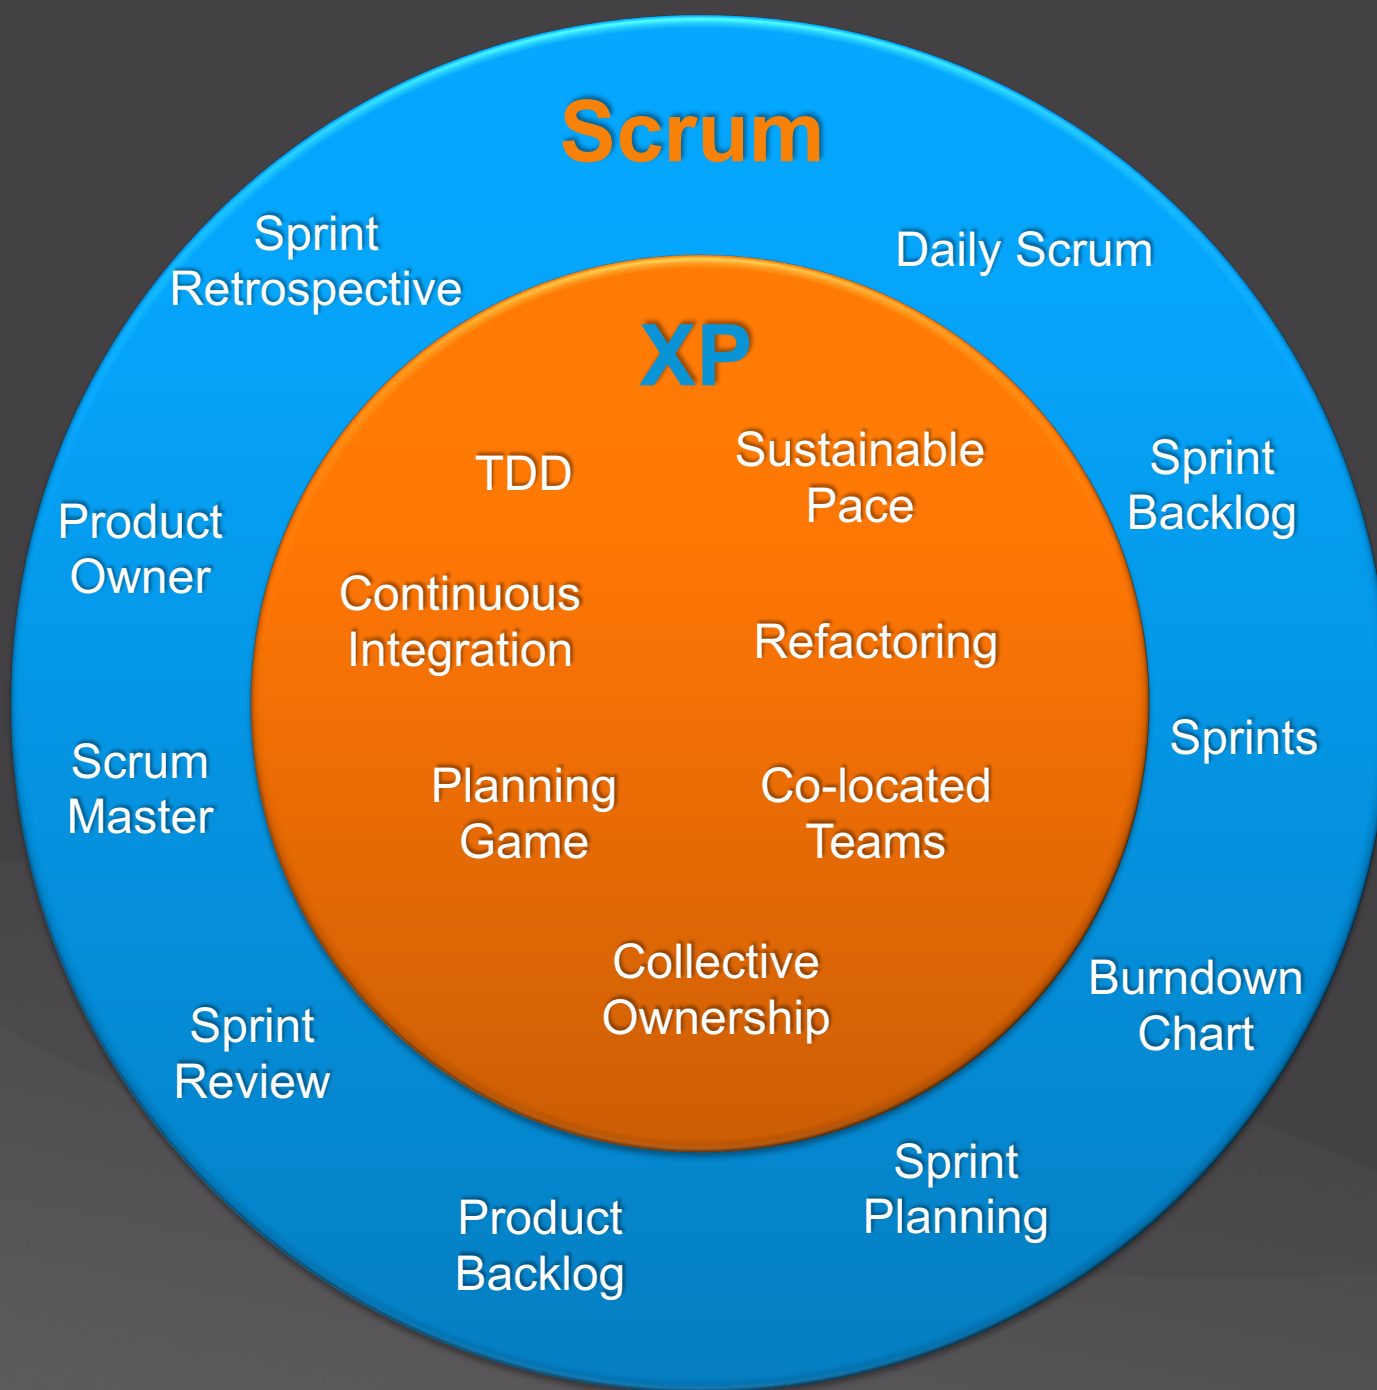

O SCRUM no Brasil

Abril Digital	Powerlogic	UOL	Microsoft
Aspercom	Dígitro	Keepplay Game Studios	SG Sistemas
C.E.S.A.R	Tecgraf	Euax Gestão de Projetos	Instituto Nokia de Tecnologia
Caelum	Visie Padrões Web	Locaweb	CVale
Globo.com	Stefanini IT	Vivo	BSA
H2J Soluções	Petrobras	DB1 Informática	B2ML Sistemas
Aurum	Borland/Microfocuss	Accion	Gol
ProcessMind	B5S Tecnologia	Add Technologies	Visual Systems


Fonte: Grupo de usuários “Scrum-Brasil”

Conceitos Fundamentais

Mini-Agenda


1. O Coração e a Alma do SCRUM
2. Papéis
3. Artefatos
4. Time Box
5. Impedimentos
6. Definição de PRONTO

O Coração e a Alma do Scrum

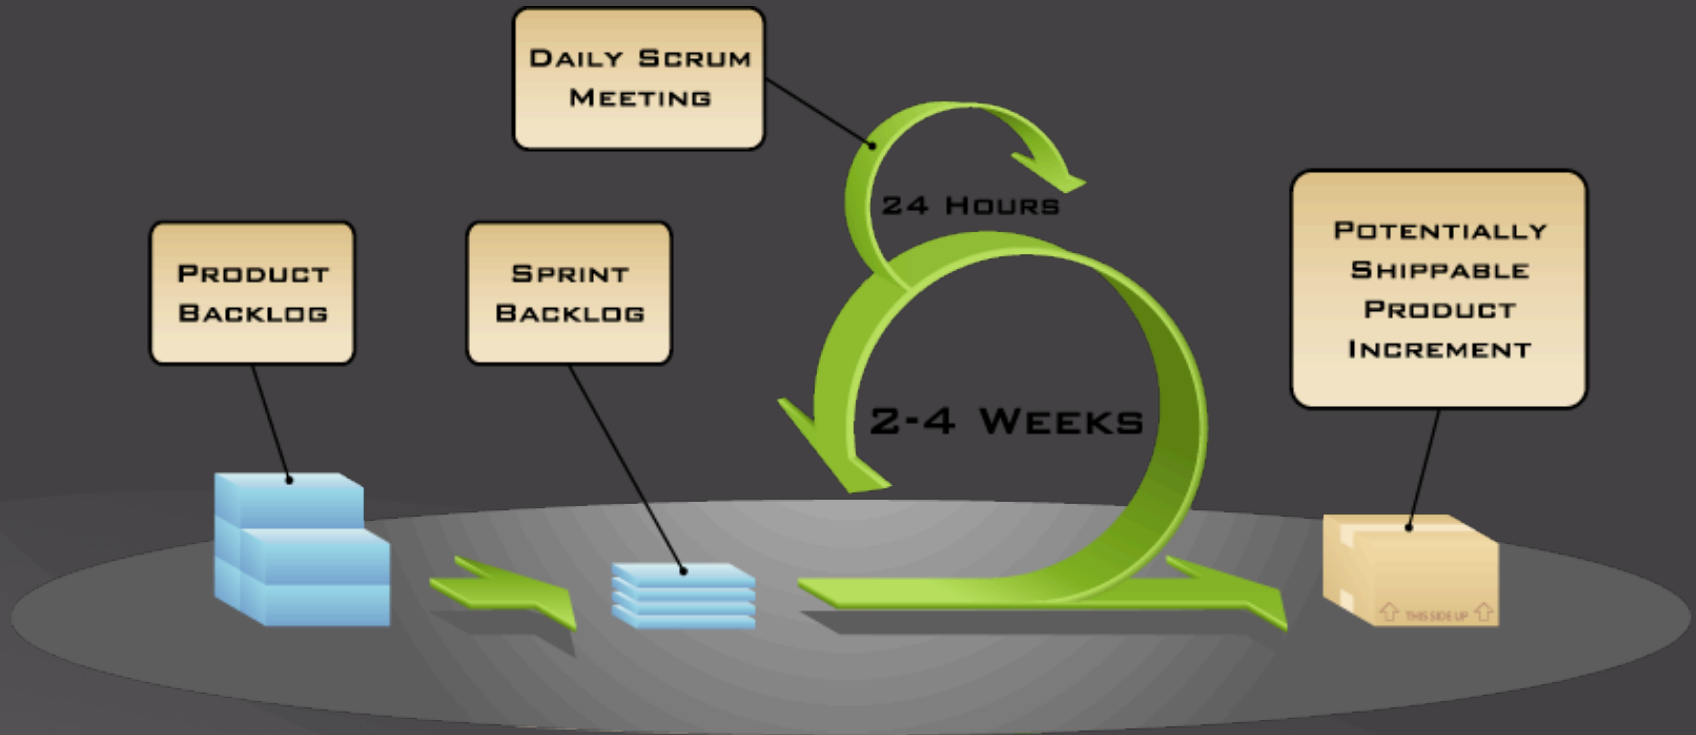

COPYRIGHT © 2005, MOUNTAIN GOAT SOFTWARE

Papéis



Product Owner



Scrum Master



Scrum Team



Stakeholders e
Usuários

O Product Owner

- Pessoa responsável por gerenciar o **Product Backlog** e assegurar o **valor** do trabalho desenvolvido pelo **Time**

Responsabilidades:

- Define as funcionalidades do produto
- Concentra informações vindas dos **stakeholders** do sistema
- Responsável pelo **ROI** do projeto
- Prioriza o **Product Backlog**
- Pode alterar as prioridades fora do **sprint**
- Aceita ou rejeita os resultados dos trabalhos



O Time

- Grupo de pessoas diretamente ligadas ao trabalho a ser feito

Características:

- Multi-funcional e auto-Organizável
- Formado por até 7 pessoas (+ - 2)
- Define, em colaboração com os demais papéis Scrum, o **Objetivo do SPRINT** e especifica os resultados do trabalho
- Se esforça para atingir o **Objetivo do SPRINT**
- Demonstram o resultado do **SPRINT** para o **Product Owner** e demais **Stakeholders**



O ScrumMaster

- Desempenha um papel de liderança gerenciando os interesses do **Product Owner** mediante à **equipe**.

Funções:

- Colaboração intensa com o P.O e o Time
- Melhorar o bem estar e a produtividade da equipe de desenvolvimento promovendo a criatividade e o conhecimento.
- Estimular uma **comunicação** e **cooperação** entre as pessoas da equipe



O ScrumMaster

Funções (continuação):

- Proteger a equipe de interferências externas
- Remover **impedimentos**
- Garantir que os princípios e regras do SCRUM sejam sendo respeitados
- Convidar, auxiliando o Product Owner, pessoas apropriadas para as reuniões de acompanhamento
 - Reunião Diária, **Revisão do Sprint**, Retrospectiva do Sprint



O ScrumMaster



Funções (cont.):

- Remover barreiras entre o Time de desenvolvimento e o cliente
 - Auxílio essencial do Product Owner
 - O cliente que deve direcionar as funcionalidades desenvolvidas
- Auxiliar o **Product Owner** a maximizar o **ROI** atingindo seus objetivos com o **SCRUM**
- Promover práticas de engenharia para que cada pedaço da funcionalidade seja **potencialmente implantável**

Artefatos



**Visão do
Produto**



Product Backlog



**Plano de
Liberações**



Sprint Backlog



**Sprint/Release
Burndown**



**Lista de
Impedimentos**

Time-Box



Time-Box

- Conceito importante para acompanhamento
 - Quando definimos um **objetivo** e um **período de tempo**, forçamos a equipe a se concentrar naquilo que é mais importante sem gastar tempo com coisas desnecessárias para o objetivo
- Pilar importante do **SCRUM** que agrega valor de negócio num curto período de tempo.

Impedimentos

- Qualquer tipo de problema que um membro do **time** possa estar enfrentando que impede o andamento dos trabalhos.
- Reportados diretamente ao **Scrum Master**
 - Papel responsável por remover essas barreiras.
 - Pode obter auxílio do Product Owner

Definição de “PRONTO”

- Os itens mais importantes do **Product Backlog** são as principais funcionalidades do sistema
 - Podem ser casos de uso, cenários, histórias de usuário ou outros.
- Como o **Time** sabe que um item do **Product Backlog** está pronto?
 - O detalhe aqui é que o **Time**, juntamente com o **SCRUM Master**, em concordância com o **Product Owner**, devem ter a sentença daquilo que o projeto define como “PRONTO”

Definição de “PRONTO”

- O **SCRUM** não considera funcionalidades 50% realizadas como é normal nas abordagens tradicionais de gestão de projetos.
 - Item só está pronto quando é **Potencialmente Implantável** acordo com a definição de **PRONTO**
- **SCRUM** é direcionado por objetivos e não por tarefas.

Definição de “PRONTO”

- É comum aos desenvolvedores acharem que ao terminar a codificação, a funcionalidade está pronta
 - No **SCRUM**, uma funcionalidade do **Product Backlog** só está pronta quando **potencialmente implantável**.
 - Ou seja, tem o potencial de entrar em produção assim que o **Product Owner** decidir.

Definição de “PRONTO”

- Alguns exemplos da definição de “Pronto”
 - Analisado, projetado, implementado e refatorado.
 - Ter sido feito os testes unitários e de aceitação e gerado a documentação e usuário
 - Builds integrados com camada de apresentação, negócios, persistência e recursos.

Definição de “PRONTO”


- O foco em **OBJETIVOS** é um dos pilares importantes do **SCRUM**,
 - Um **time** que realmente segue a metodologia **SCRUM** planeja baseada em **OBJETIVOS**
 - Executa tarefas baseada em **OBJETIVOS**
 - Reporta andamento do projeto baseada em **OBJETIVOS** e não em porcentagens.

O Coração e a Alma do Scrum

Mini-Agenda

1. O Coração e a Alma do Scrum
2. Iniciação do Projeto
3. Planejamento do Sprint
4. Planning Poker
5. Sprint
6. Revisão do Sprint
7. Retrospectiva do Sprint
8. Incremento de Produto

O Coração e a Alma do Scrum

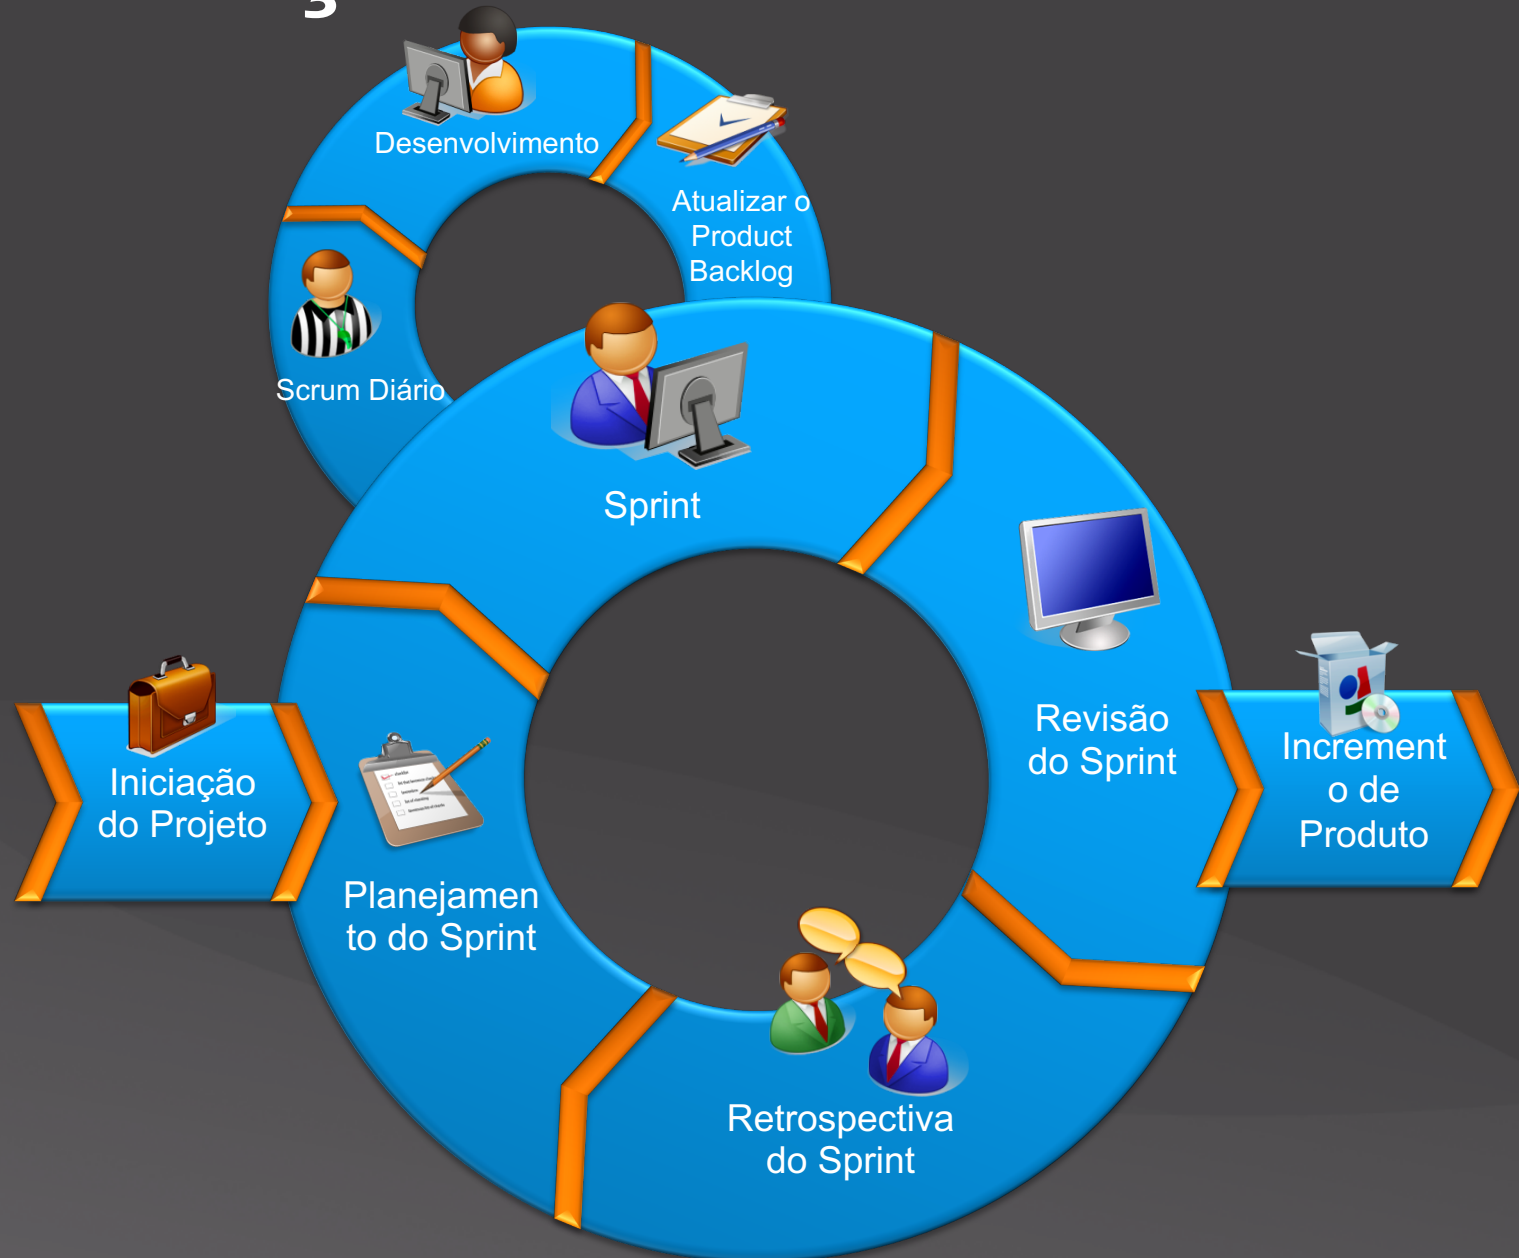



Iniciação do Projeto




Project
Initiation



Product
Development

Retrospective

Criação do Product Backlog

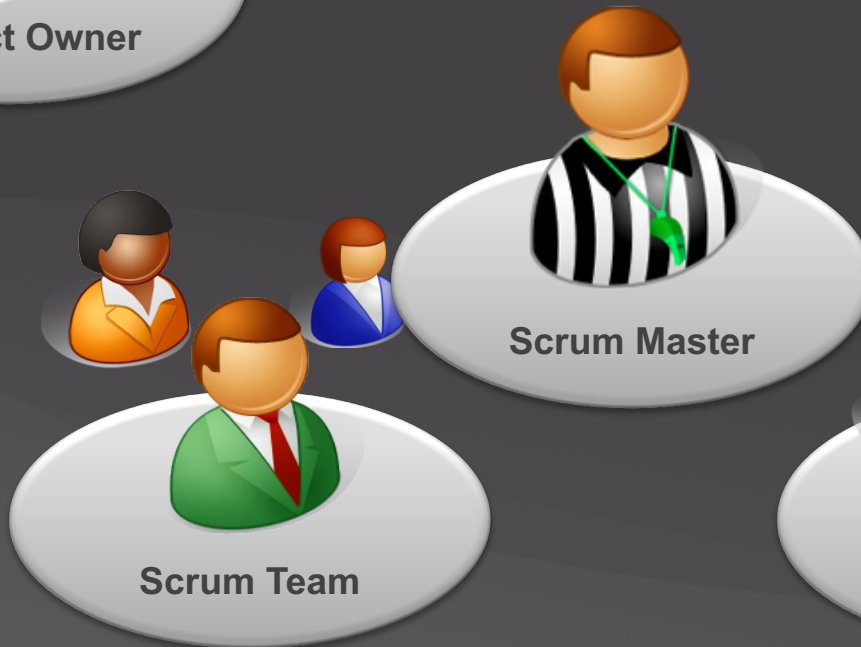


Porcos, Galinhas e Artefatos



Business Case



Visão do
produto



Product Backlog



Time Scrum



Plano de
Liberação



Product Owner



Stakeholders e
Usuários



Scrum Master



Product Backlog



Histórias do Usuário

Priorizadas por Valor




Estimadas pela Equipe

Responsável: Product Owner



História de Usuário

- INVEST
 - Invista em boas Histórias.
- No **Scrum**, requisitos são normalmente capturados como Histórias de Usuário
- Uma História do Usuário é uma descrição de objetivos do usuário para com o sistema

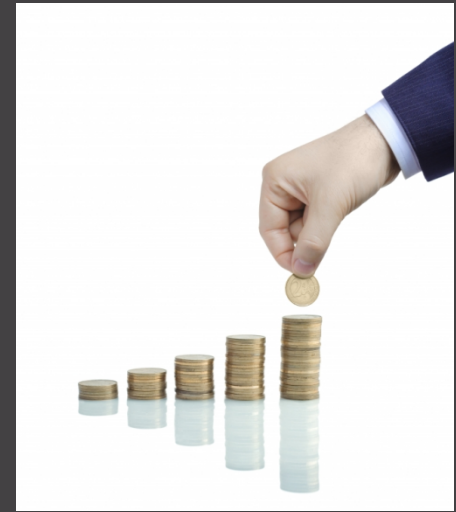

História de Usuário

Historias de Usuário são parecidas com
descrições de funcionalidades

História de **Usuário**

Historias de **Usuário** destacam o papel do usuário

História de **Usuário**

O **Objetivo** que eles estão tentando atingir

História de Usuário

E o valor do objetivo

História de Usuário

Enquanto <*tipo do usuário*>,
eu quero <*atingir um objetivo*>, de forma
a obter <*algum valor*>

História de **Usuário**

Existem historias de usuário **boas** e **ruins**

História de **Usuário**

Usando objetivos **S.M.A.R.T**, Bill Wake
nos aconselha a **I.N.V.E.S.T** em
historias de usuário

História de **Usuário**

I.N.V.E.S.T

Independent

Negotiable

Valuable

Estimable

Sized right

Testable

História de Usuário

- Independente

- Evite dependências entre histórias
- Escreva histórias para estabelecer o alicerce do sistema
- Combine histórias similares em uma única iteração quando apropriado.

História de Usuário

- **Negociável**
 - Histórias não são contratos
 - Muitos detalhes sugerem que não existe nada mais a explorar
 - Saiba quando não é possível negociação. Algumas restrições são fixas.

História de Usuário

- Valorosa
 - Exiba o valor da história para os clientes e outros Stakeholders.

História de Usuário

- Estimável

- Apresente detalhes suficientes para estimativa do esforço de trabalho.
- Histórias devem ser pequenas para serem estimadas
 - Mas não muito pequenas.

História de Usuário

- Tamanho Correto

- Historias devem ser pequenas o suficiente para serem completadas em um Sprint
 - Não recomendamos historias maiores que duas semanas.
- Quanto mais próximo de se trabalhar em uma historias, mais especifica ela deve ser.
- Historias podem iniciar em um nível alto de abstração (epic)
 - Mas elas precisam ser quebradas em momento oportuno

História de Usuário

- Testável

- O critério de aceitação deve estar presente em uma historia
- Os testes devem ser automatizados sempre que possível

História de Usuário



Enquanto (papel)
eu quero (algo)
para (benefício).

Condições de
Aceitação ou
Narrativa

História de Usuário

Pesquisar Catálogo

Enquanto usuário registrado eu quero poder pesquisar o Catálogo online atrás de itens para compra.

Pontos: 3

Valor de negócio: 600

História de Usuário

Narrativa

1. Abrir a página de busca.
2. Entrar com vários critérios de busca.
3. Iniciar a busca.
4. Visualizar os resultados dos itens do catálogo que contém uma ou mais palavras-chave em seu título ou descrição

Testes

- Strings entre aspas usadas para busca exata.
- Testar os operadores E, OU, +, e -.
- Os resultados devem estar disponíveis em até 5 segundos
- Tentar Caracteres inválidos.

História de Usuário

Tarefas S.M.A.R.T

Specific

Measurable

Achievable

Relevant

Time Boxed

História de Usuário

Tarefas S.M.A.R.T

- Específica

- A Tarefa deve ser específica o suficiente para que todos envolvidos a compreendam.

- Mensurável

- Podemos declarar a tarefa como pronta?

- Realizável

- O dono da tarefa deve ser capaz de implementá-la
 - Qualquer um pode solicitar auxílio

História de Usuário

Tarefas S.M.A.R.T

- Relevante

- Cada tarefa deve contribuir para a implementação da História de Usuário

- *Time-Boxed*

- Uma tarefa deve ser limitada a uma duração específica.



Planejamento do Sprint



Project
Initiation



Development



Sprint
Retrospective


Planejamento do **Sprint**



Planejamento do **SPRINT**

- O **SPRINT** inicia com um planejamento feito em duas partes
 - Criação do **PRODUCT BACKLOG** priorizado
 - Definição do **SPRINT BACKLOG**
- No planejamento, todos os envolvidos planejam quais serão os objetivos a serem finalizados nos próximos 28 dias
 - Caso seja utilizado um **sprint** de 30 dias.

Planejamento do **SPRINT**

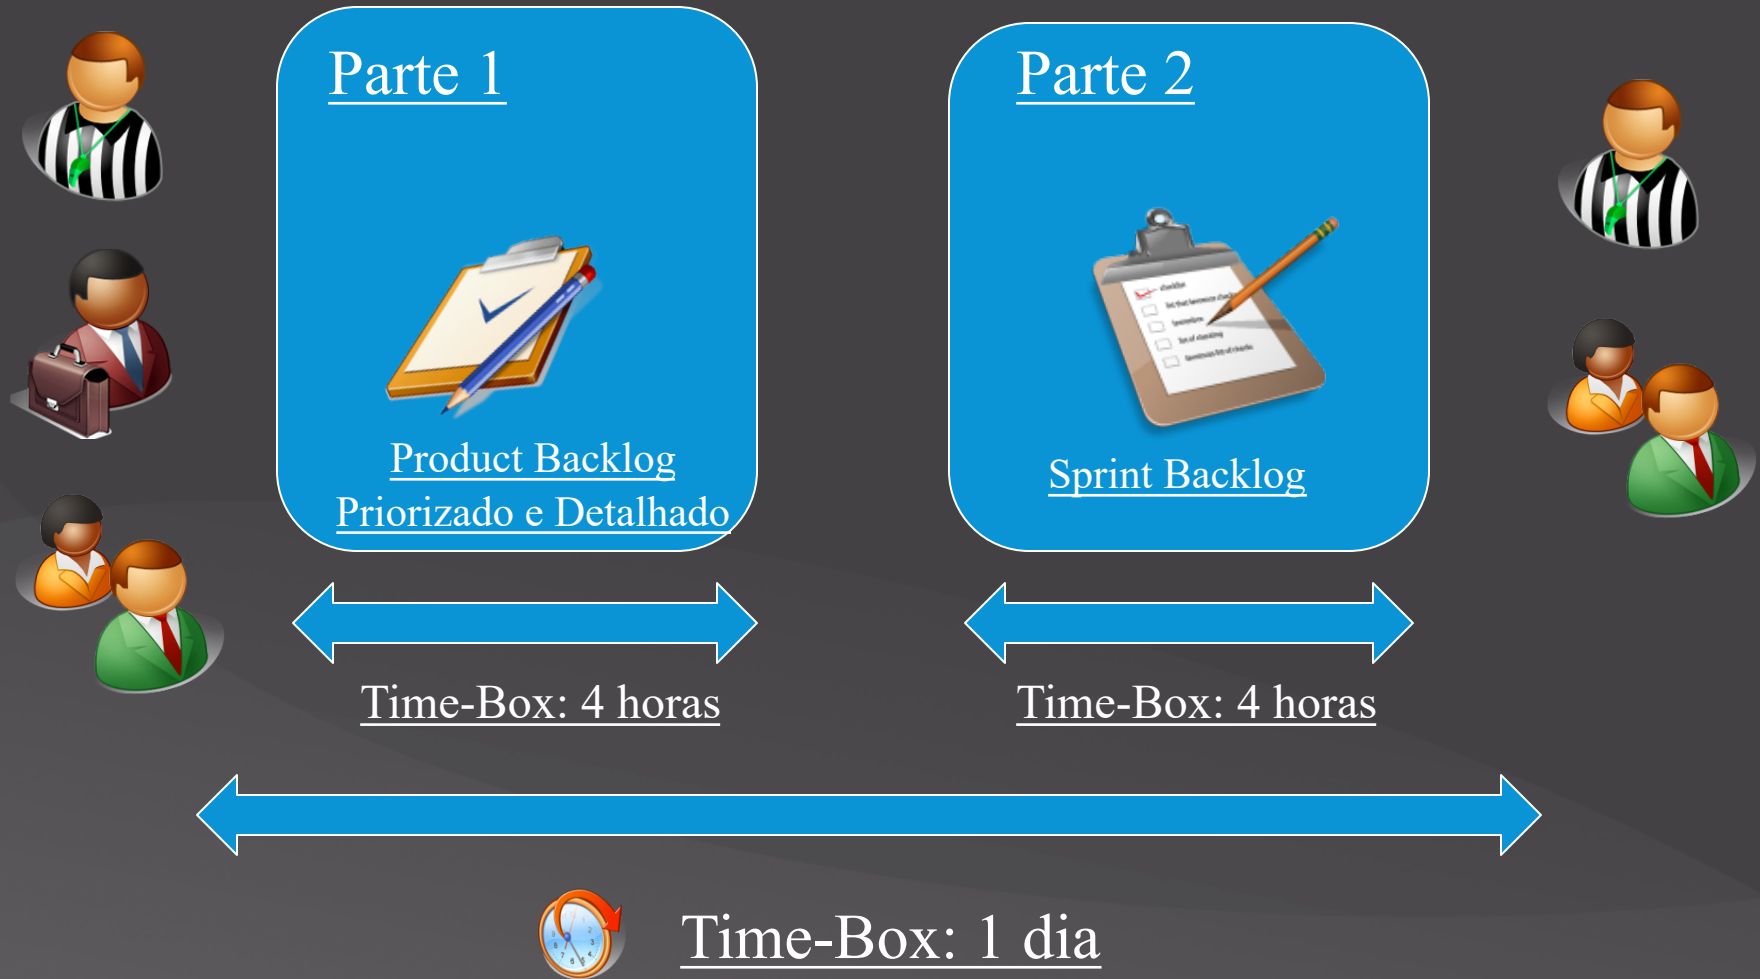

Planejamento do Sprint

- Primeira Parte
 - Scrum Master e Product Owner para definição/verificação/detalhamento do Product Backlog
 - Product Backlog pode ser representado em documento comum ou planilha onde constam todas as funcionalidades do sistema.
- Segunda Parte
 - Scrum Master, Time e Product Owner (opcional) se reúnem para planejamento do Sprint baseado no product backlog criado ou atualizado.
 - Product Owner e Scrum Master apenas definem a ordem das coisas, não os prazos, que são fornecidos pelo Time.

Planejamento do **Sprint**

- Na primeira parte da reunião, a conversa deve focar no **ROI** do projeto.
- O trabalho de ordenar o **Product Backlog** é uma importante tarefa, pois o **Product Owner** decidirá aquilo que agregará mais valor ao software para ser entregue no final do **sprint**.

Planejamento do Sprint

- Primeira Parte – Product Backlog Inicial ↵

ID	Descrição	Sprint	Esforço	Conclusão
1	Gerenciar Reservas			
2	Efetuar Pagamento			
3	Fazer check-in			
4	Fazer check-out			
5	Gerar relatórios			
6	Gerenciar Reservas Online			
7	Registrar consumo			

Itens na parte superior possuem maior valor de negocio e são detalhados na reunião.


Planejamento do **Sprint**

- Na segunda parte da reunião:
- Selecionar quais itens **potencialmente implantáveis** serão implementados no **sprint**
- Cabe ao **Time**:
 - Fazer a estimativa dos itens potencialmente implantáveis usando, por exemplo, **Planning** Poker
 - O **Time** quebra cada item selecionado em tarefas menores que podem ser cumpridas em um dia (**desejável**).

Planejamento do Sprint

- Os itens que aparecem no **Product Backlog** são qualquer tipo de funcionalidade ou tarefa que possua um valor para o **Product Owner**.
- Funcionalidade Potencialmente Implantável
 - Significa que quando esse item do **Product Backlog** for finalizado ele estará completamente funcional e resolvendo algum problema de negócio dos **stakeholders**

Planejamento do **Sprint**

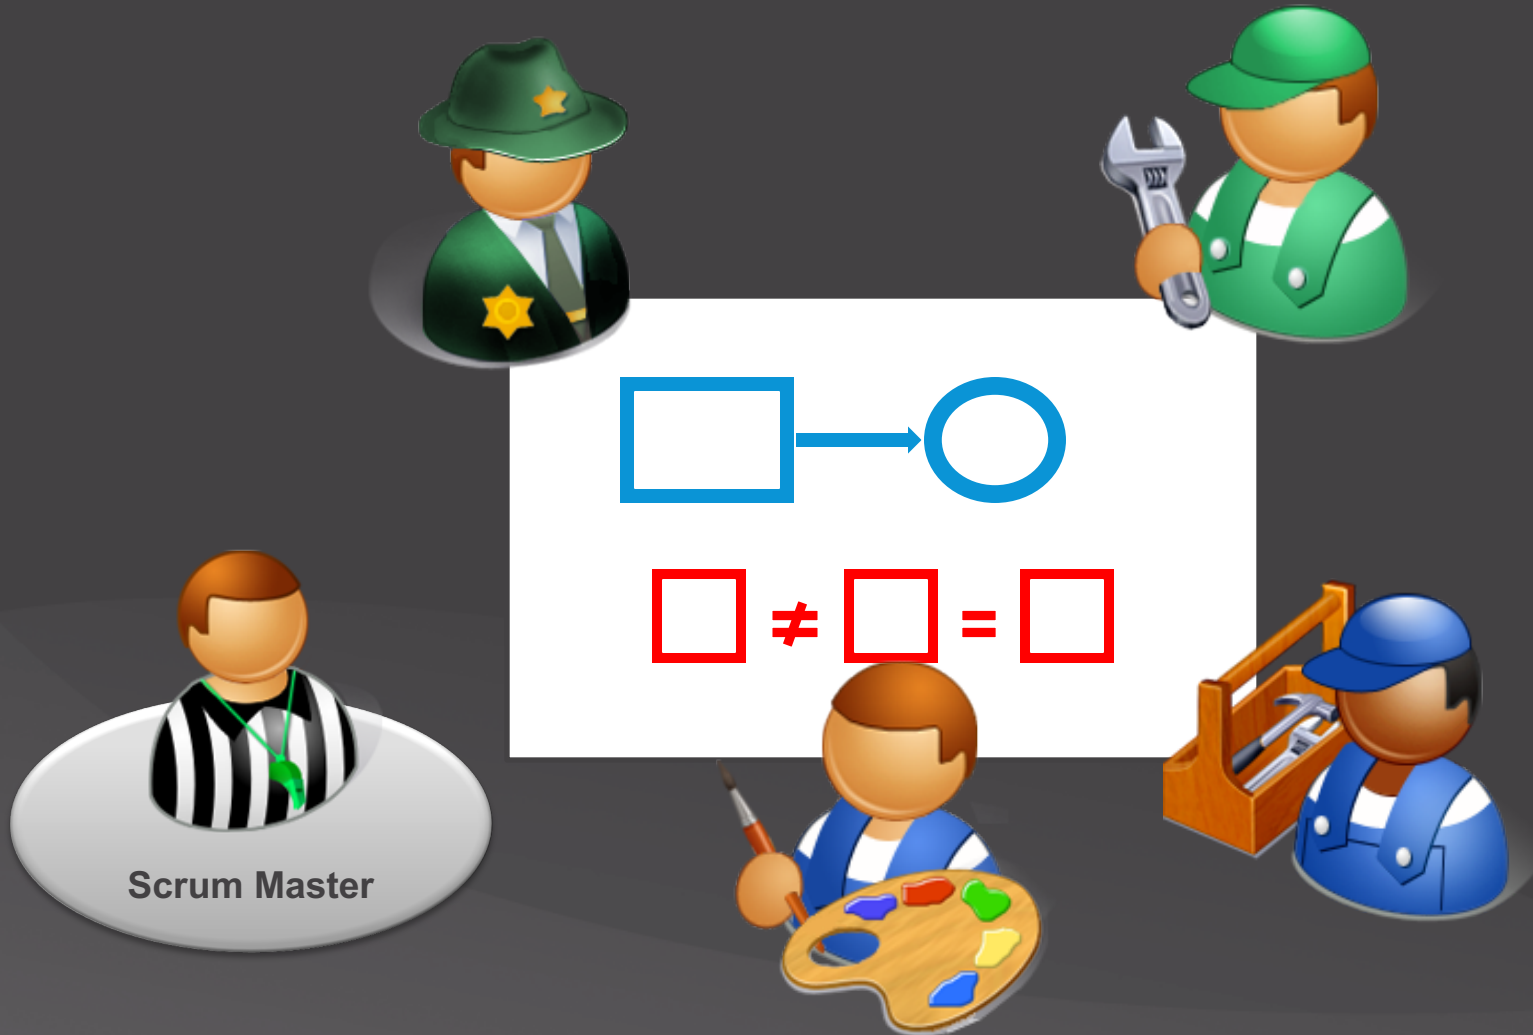

Planning Poker

Planejamento do Sprint

- Principal problema de estimativas em grupo:
 - Impacto que a opinião dos outros tem sobre a sua.
- Existe uma técnica para isolar esse efeito, chamada Planning Poker
 - Cada membro da equipe recebe um conjunto de cartas com os números 1, 2, 3, 5, 8 da sequência de Fibonacci.
 - Outros números são possíveis

Planejamento do **Sprint**

Planning Poker

- Escala bastante usada porque não deixa tantas dúvidas na escolha do número de **Fibonacci** que representa o esforço.

Planejamento do Sprint

Planning Poker

- Não recomenda-se o uso dos números 13 e 21.
 - Quanto maior o número, mais difícil o planejamentos das iterações.
 - Trabalhar com objetivos menores permite uma gestão melhor e estimativa mais precisa
 - Números maiores podem ser usados para Temas e Epics
 - Normalmente 20, 30, 50, 100

Planejamento do **Sprint**



3



5



3



8



Scrum Master

Planning Poker

Planejamento do **Sprint**

Pesquisar Catálogo: esforço :3

Enquanto usuário registrado eu que poder pesquisar o catálogo online atrás de itens para compra.

Valor de Negócio: 600



$$\square \neq \square = \square$$



Planejamento do Sprint


ID	Descrição	Sprint	Esforço	Conclusão
1	Enquanto Agente de Reservas eu gostaria de criar uma nova Reserva	1	8	
2	Enquanto Agente de Reservas eu quero poder consultar uma Reserva existente pelo número ou pelo nome do hóspede	1	3	
3	Uma Reserva possui um ou mais quartos para um período específico de tempo	1	1	
4	Efetuar Pagamento		30	
5	Fazer check-in		20	
6	Fazer check-out		20	
7	Gerar relatórios		8	

Granularidade aumentando

Planejamento do Sprint

Estimativas com Pontos de Historia

- Esforço adicional nas estimativas para os requisitos agrega pouco valor após certo ponto

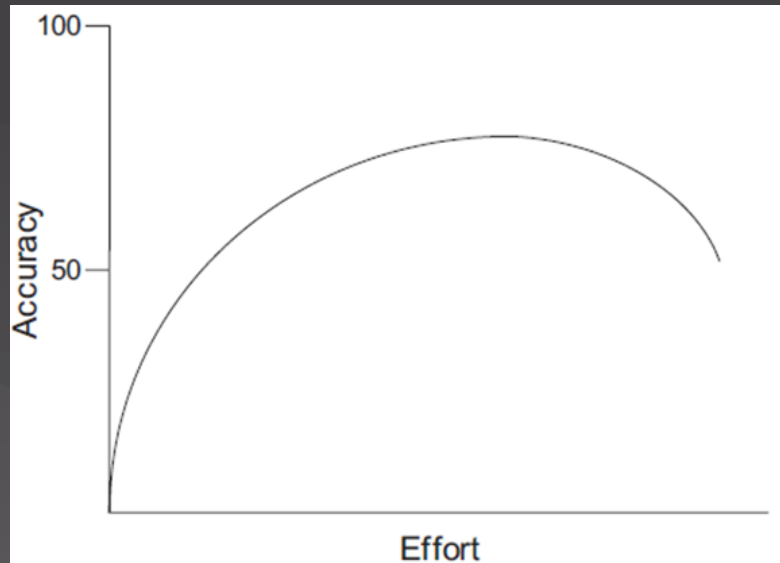

Planejamento do **Sprint**

Estimativas e **Métricas** Ágeis

- No **SCRUM**, usam-se **métricas ágeis** e o conceito de **velocidade** para obter prazos a partir de uma lista de funcionalidades.
- É importante ressaltar que essas métricas são **otimizadas** com **equipes consistentes** de **baixa rotatividade**

Planejamento do Sprint

Pontos, Velocidade e Prazo

- Uma estimativa se obtém através de uma **medida de esforço** e a **velocidade** para vencer este esforço.
 - Recomenda-se esforço não atrelado a uma unidade de tempo (**esforço relativo**).
- A **velocidade** significa qual é a minha performance esperada dentro do **Sprint**
 - Nessa performance estão embutidos as restrições do ambiente, os riscos e a produtividade.

Planejamento do **Sprint**

Pontos, Velocidade e **Prazo**

- Para projetos de software, utilizamos “**Pontos**” para mensurar o esforço do **Product Backlog**
 - Os pontos representam o tamanho funcional e a complexidade técnica do item do **Product Backlog**

Planejamento do Sprint

Estimando a Velocidade

- Para obter o prazo, precisamos saber quantos **pontos** conseguimos vencer dentro de um período de tempo.
- **Pontos** do sprint:
 - Quantidade de pontos que a equipe consegue entregar dentro do **TimeBox** de aproximadamente 30 dias.

Planejamento do **Sprint**


- Nos primeiros **sprints** a incerteza com relação à produtividade da equipe é muito grande
 - Então, para o primeiro Sprint, simplesmente perguntamos à equipe o que ela acredita entregar até o fim do Sprint.

Planejamento do Sprint

Velocidade

Product Backlog

8 Pontos de História

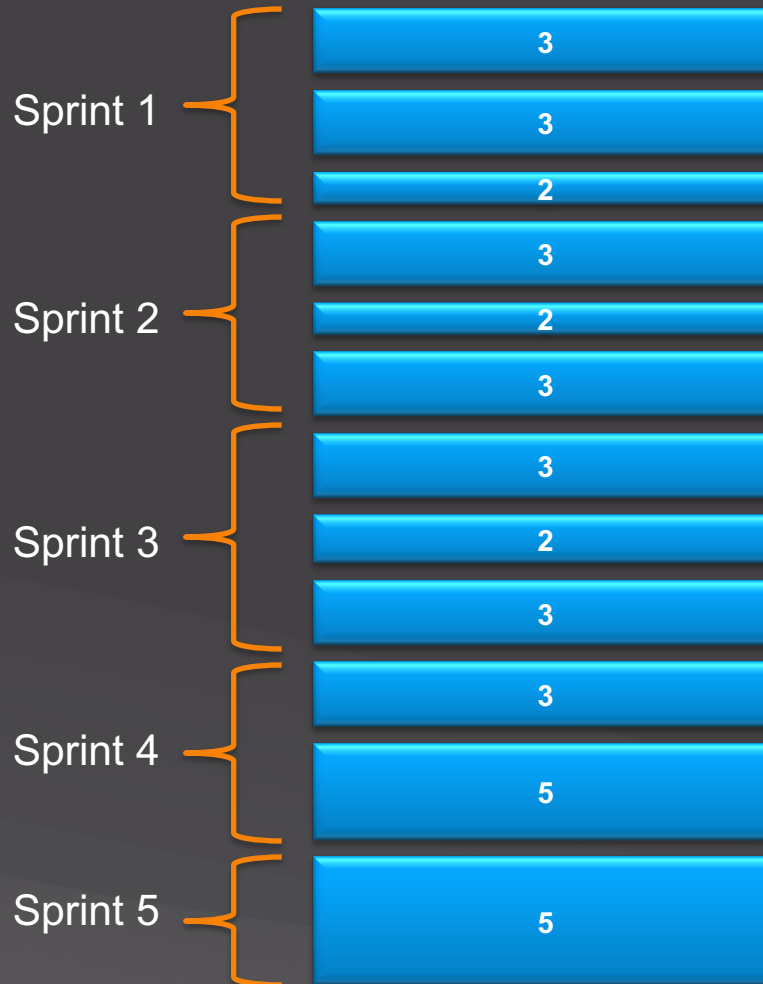

Total Pontos: 37

Planejamento do Sprint

Estimando o prazo do projeto

- Pegando 8 pontos por Sprint já temos uma previsão inicial de 5 Sprints


Total de pontos = 37

Velocidade Estimada = 8

Prazo = $37/08 = 4,625 = 5$ Sprints

Planejamento do **Sprint**

Plano de Liberações

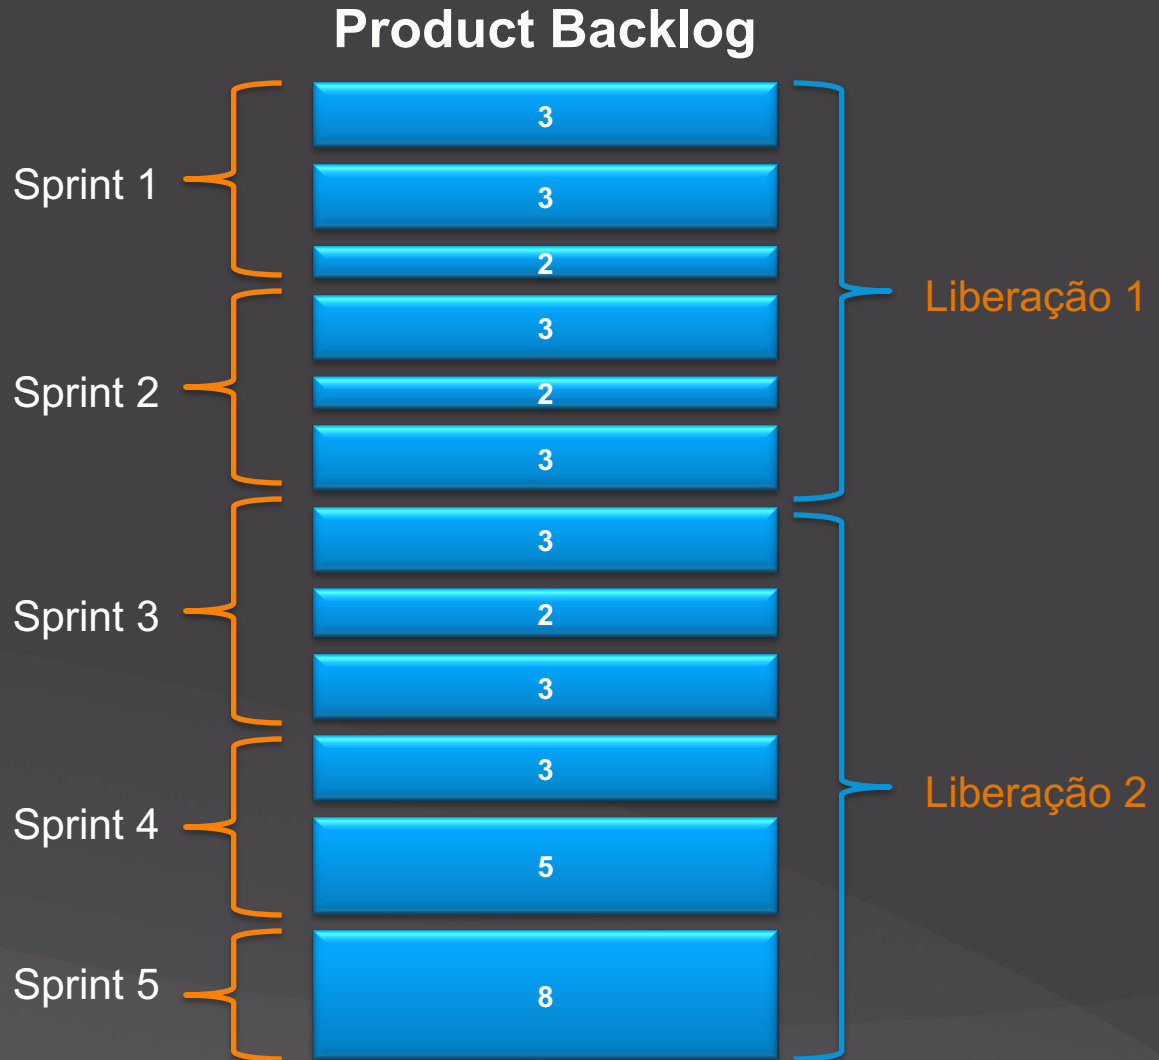

Velocidade: 8 Pontos de História

Planejamento do **Sprint**

Sprint Backlog

- O **Sprint Backlog** é o produto de trabalho do dia de **planejamento**
 - Quadro montado a cada **Sprint**
- É importante que os itens do **topo da lista** sejam resolvidos primeiro
- Toda metodologia de gerenciamento de projetos é baseada em planejamento, execução, controle e avaliação
 - No **SCRUM** isso não é diferente

Planejamento do **Sprint**

Sprint Backlog

- Cada item do Product **Backlog** selecionado para o Sprint é quebrado em tarefas menores, mensuradas em horas
 - Sugere-se que cada quebra individual não ultrapasse 16h.
 - Esta quebra de cada item é chamado **SPRINT BACKLOG**

Planejamento do Sprint

Sprint Backlog

- O Time deve consultar o **ScrumMaster** e o **Product Owner** nos casos de dúvidas que irão surgir no momento do detalhamento do item em tarefas.
- O detalhamento ideal esclarece tudo aquilo necessário para tornar o item em algo pronto.
 - Isso vai ocorrendo no decorrer do **sprint**.

Planejamento do **Sprint**

Pesquisar Catálogo: 3

Enquanto usuário registrado eu quero pesquisar o catálogo online atrás de itens para compra.

Criar a Página de Busca: 8h

Criar a classe de Consulta: 4h

Criar testes unitários: 2h

Criar o método de busca: 8h

Planejamento do Sprint

Sprint Backlog

Histórias de Usuário	Pendente	Em progresso	Pronto	Impedimento
Enquanto xxxxx, eu quero!	Criar Form para Cadastro dos dados	Criar Modelo de Dados Criar Testes Unitários Autenticar Administrador	DAO Genérico	
Enquanto xxxxx, eu quero!	Criar Form para inclusão de notícias Permitir upload de vídeo atrelado à notícia	Autenticar Colunista Criar Modelo de Dados		
Enquanto xxxxx, eu quero!	Criar página principal do portal Definir Layout do portal Criar CSS externo			

Planejamento do **Sprint**

Estimativas e o Product Backlog

- É importante que no planejamento do **Primeiro Sprint** ou numa fase inicial de concepção, a maioria dos itens do **Product Backlog** esteja com uma estimativa inicial de esforço em **Pontos** de **História**
- São necessários de 3 a 4 **Sprints** para que a produtividade da equipe seja melhor adaptada a realidade.



Sprint

Project
Initiation

Product
Development

Retrospective

Sprint

Iterativo e Incremental

- **Processos iterativos** minimizam riscos oferecendo uma rápida avaliação dos usuários a respeito daquilo que está sendo desenvolvido
- **Iteração** é um **período de tempo fixo** onde a equipe está trabalhando para que, ao final deste período, algo de valor seja demonstrado para os usuários

Sprint

Iterativo e Incremental

- No **SCRUM**, a **iteração** é chamada de **SPRINT**.
- Período de tempo de um **SPRINT** pode variar
 - Recomendável **30 dias** !
- Um **PROJETO SCRUM** é composto por vários **SPRINTS** de mesmo tamanho.

Sprint


Iterativo e Incremental



Sprint

Time Box

- Durante o SPRINT, a equipe faz de tudo para que os objetivos sejam alcançados.

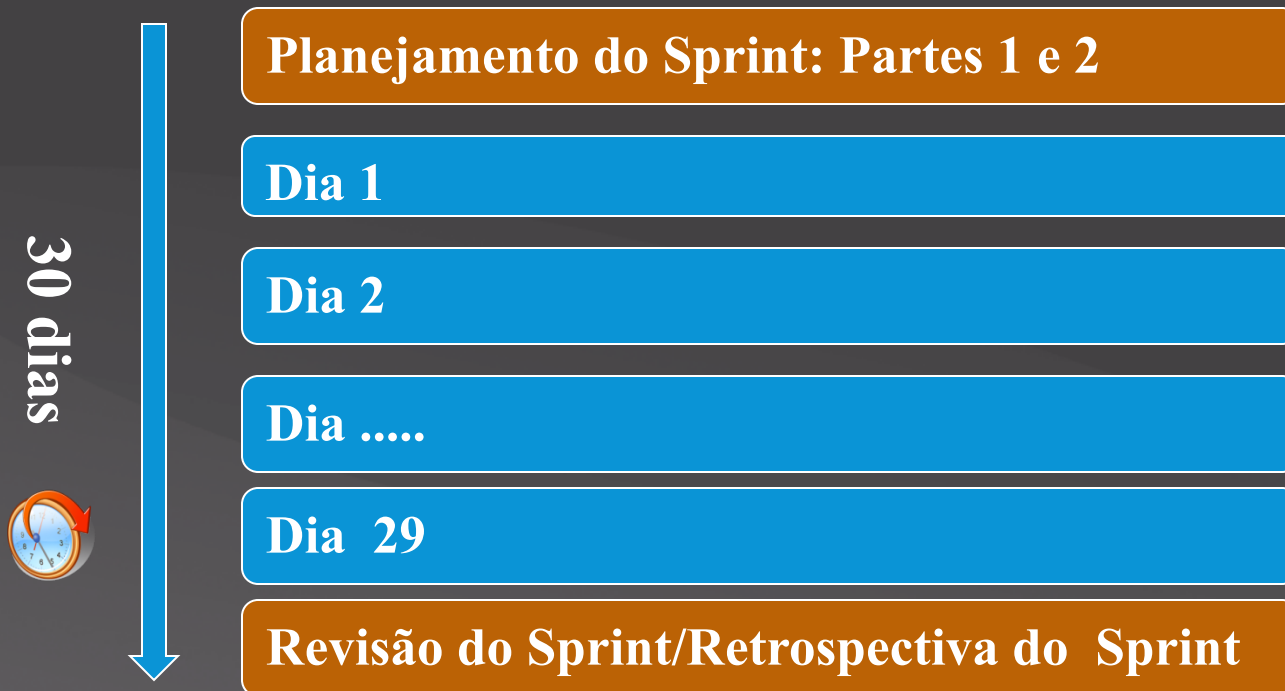

Sprint

Desenvolvimento

- Durante os 28 dias após o planejamento a equipe trabalha e colabora entre si em constante comunicação.
- No último dia do **SPRINT** todo o trabalho da equipe é avaliado juntamente com o **PRODUCT OWNER**
 - O **PRODUCT OWNER** pode dar novos direcionamentos para o projeto

Sprint




**Gestão de
Configuração**



**Integração
Contínua**



Desenvolvedor



Testes Unitários



**Testes de
Funcionalidade**


Desenvolvimento

Sprint

Utilizando o Burndown Chart

- Usado para reportar o andamento do projeto de maneira mais amigável



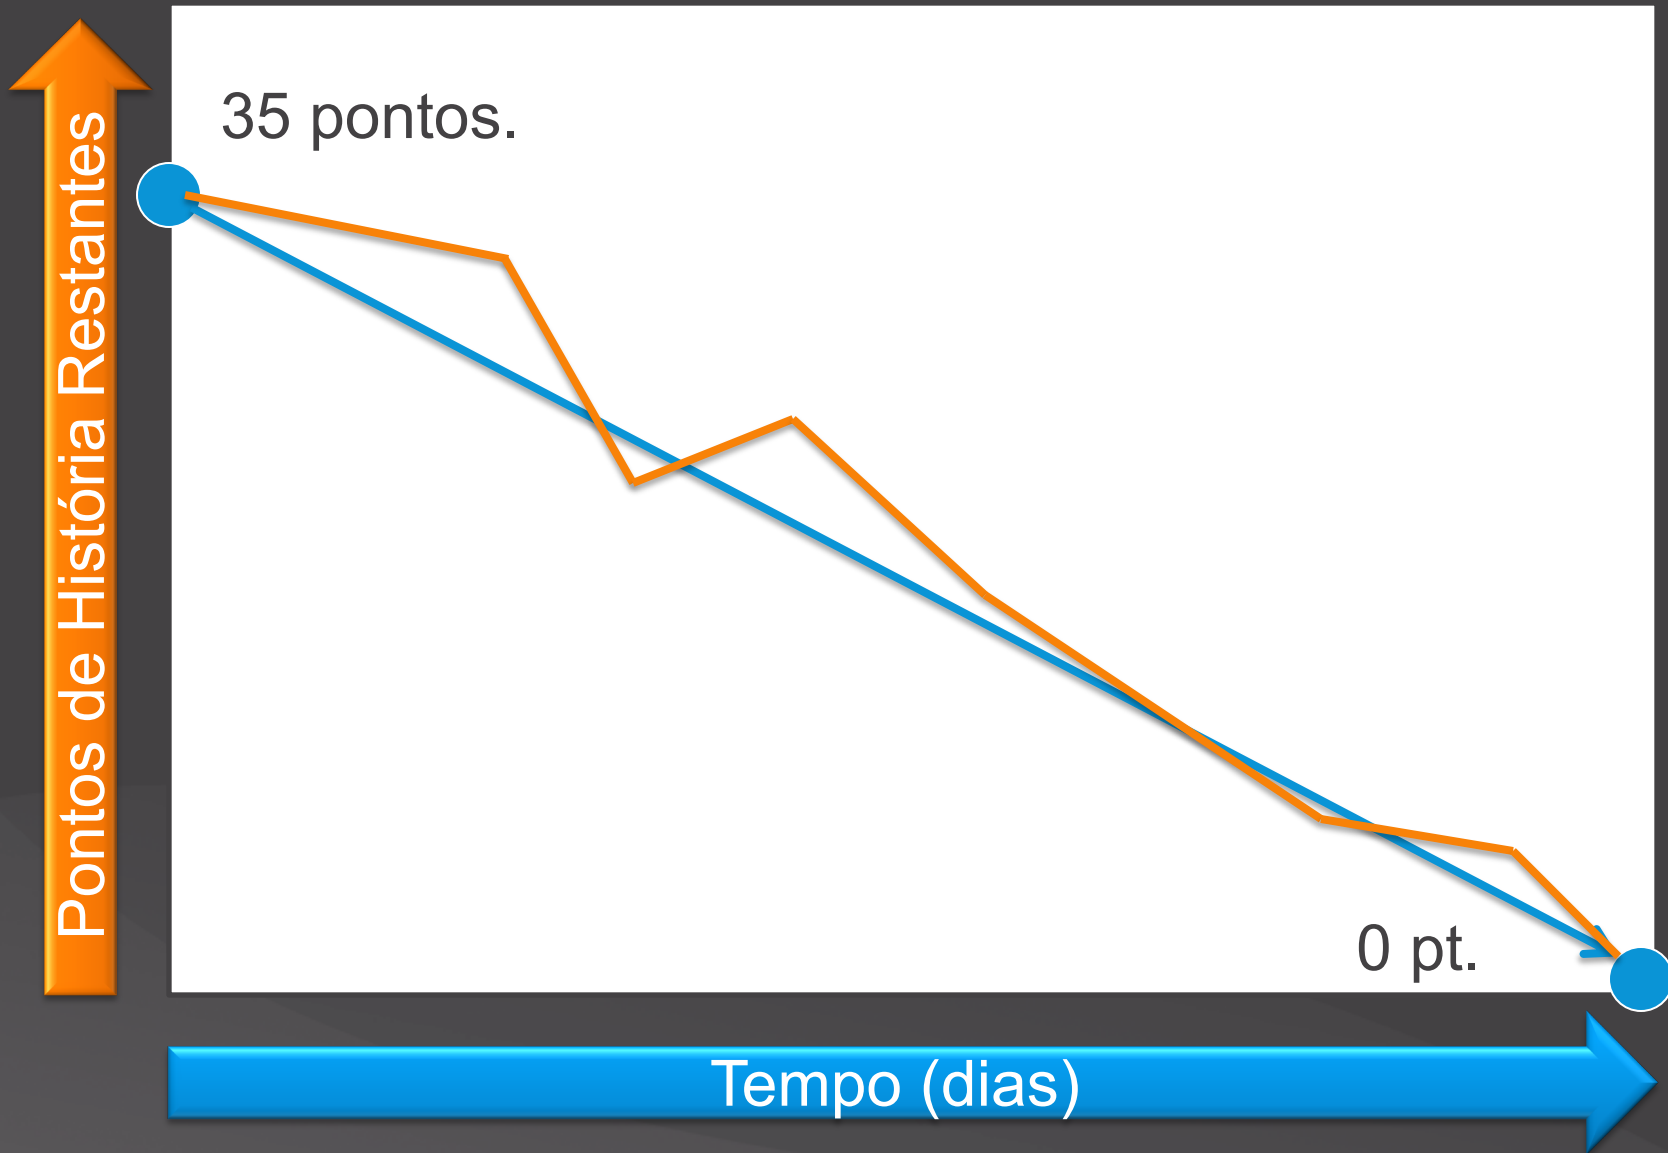

Sprint Burndown

Sprint

Utilizando o Burndown Chart

- **Eixo X**
 - Duração do Sprint.
- **Eixo Y**
 - Número de pontos “a serem vencidos” que representam o peso das funcionalidades potencialmente implantáveis do Product Backlog.

Sprint

Utilizando o Burndown Chart

- Interseção abaixo da **linha azul**
 - velocidade está acima do planejado.
- Interseção acima da **linha azul**
 - Não estamos vencendo os pontos na velocidade planejada
 - tendência é não cumprirmos o prazo.

Sprint

Encerrando o Sprint

- A data final do Sprint é o marco para o fim do Sprint e não as funcionalidades implementadas.
 - O Sprint termina mesmo que esses 3 itens não estejam “prontos”
 - O Sprint de tamanho fixo durante todo o projeto é um importante mecanismo para mensurar a **real produtividade** do time melhorando as estimativas a cada Sprint.

MELHOR PERDER **FUNCIONALIDADES** DO QUE
DATAS !



Scrum Master



Time Scrum

Reunião Diária

Project
Initiation

Product
Development

Retrospective

Reunião Diária



Scrum Master



Time Scrum



Sprint Backlog



Sprint
Burndown



Lista de
Impedimentos

Reunião Diária

- Ocorre todos os dias durante o **Sprint**
- Encontro entre o **Scrum Master**, o **Time** e qualquer pessoa interessada no projeto.
- **TIME-BOX** de 15 minutos no máximo
 - Não dure duas ou 3 horas comprometendo a produtividade da equipe

Reunião Diária

- Três perguntas devem ser respondidas:
 1. O que eu **fiz** desde a última reunião diária?
 2. O que eu **pretendo fazer** até amanhã?
 3. Tem alguma coisa **impedindo** o meu trabalho?

Reunião Diária

- É aconselhável que a reunião diária ocorra todo o dia no mesmo horário.
- A reunião diária promove **auto-organização**, um maior **comprometimento** das pessoas e um **compartilhamento** de responsabilidades

Inspeção e Adaptação





Revisão do Sprint




Project
Initiation



Product
Development

Retrospective

Revisão do Sprint

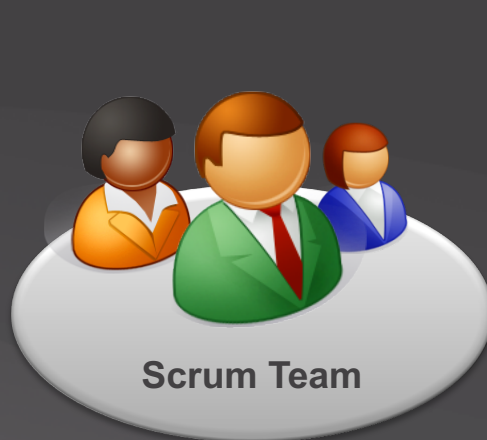

Revisão do Sprint

- Importante ponto de inspeção do SCRUM.
- Ocorre no último dia do SPRINT e representa o momento que o TIME e o SCRUM Master demonstram as funcionalidades potencialmente implantáveis para o Product Owner
- A funcionalidade potencialmente implantável é a única medida real a respeito do andamento do projeto que pode reduzir a incerteza

Revisão do **Sprint**

- É inadmissível para a filosofia do **SCRUM** que ao final do **Sprint** sua equipe só entregue documentos para o **Product Owner**.

Inspeção e Adaptação





Comprometimento: 12



Entregue: 11

ID	Descrição	Sprint	Esforço	Conclusão
1	Enquanto Agente de Reservas eu gostaria de criar uma nova Reserva	1	8	
2	Enquanto Agente de Reservas eu quero poder consultar uma Reserva existente pelo número ou pelo nome do hóspede	1	3	
3	Uma Reserva possui um ou mais quartos para um período específico de tempo	1	1	
4	Efetuar Pagamento		30	
5	Fazer check-in		20	
6	Fazer check-out		20	
7	Gerar relatórios		8	

Inspeção e Adaptação

- De acordo com a figura anterior, o item “*Uma reserva possui um ou mais...*” não foi implementado
 - Será entregue no **Sprint 2** caso a prioridade seja mantida.
- Nessa situação, deve ser avaliada a causa do não cumprimento .
 - Uma possibilidade é a velocidade do time ser menor que a prevista.
 - Lembre-se: o **Product Backlog** é atualizado constantemente durante o projeto.

Inspeção e Adaptação

- Com o replanejamento pode ser que surja um novo Sprint. Nesse caso o Product Owner deve decidir se deseja:
 - Aumentar o custo (aumentar a equipe, horas extras)
 - Aumentar o prazo
 - Abrir mão de funcionalidades.
- O Scrum possui dois valores importantes: “TRANSPARÊNCIA” e a “ARTE DO POSSÍVEL”



Retrospectiva do Sprint



Project
Initiation



Product
Development

Retrospective

Retrospectiva do **Sprint**



Product Owner



Scrum Master



Scrum Team



Stakeholders e
Usuários

Retrospectiva do **Sprint**

- O **SCRUM** é um conjunto de práticas focadas em **melhoria** contínua do **processo**.
- O **SCRUM** como controle empírico, não prega uma rigidez do processo, ao invés, promove constante adaptação das práticas mesmo durante o projeto.
- O processo pode mudar de um **SPRINT** para outro sempre buscando uma melhoria na produtividade ou qualidade do produto final.

Retrospectiva do **Sprint**

- Finalmente, temos um momento de retrospectiva
 - Discussão sobre **lições aprendidas** e **ajustes** necessários no processo
 - Planejamento do novo **SPRINT**.
- Todos os **Sprints** possuem uma estrutura exatamente igual
 - Planejamento, cumprimento, avaliação do resultado e ajuste o processo

Inspeção e Adaptação



Retrospectiva do Sprint

O que caminhou bem?

Gestão com maior visibilidade

Mais clara a idéia de em que trabalhar

Eu gostei do quadro de tarefas

O que poderia melhorar?

Melhorar os testes unitários

Mais tempo refatorando


Daily Scrum muito longa

Testes unitários

Feedback mais rápido da gerência




Lições Aprendidas



Time Box: 3 horas

Retrospectiva do **Sprint**

- Nessa reunião o objetivo é a transparência interna do **TIME**.
- O **SCRUM Master** deve avaliar os pontos apresentados e prover os recursos necessários para que as mudanças ocorram.
- Um dos problemas mais comuns é a equipe não buscar ou se empenhar para que as mudanças no processo ocorram.
 - A **adaptação contínua** é um fundamento importante para controlar projetos críticos e esses pontos de melhorias devem ser valorizados
 - As **lições aprendidas** é um fundamento em muitas metodologias de gestão de projetos.

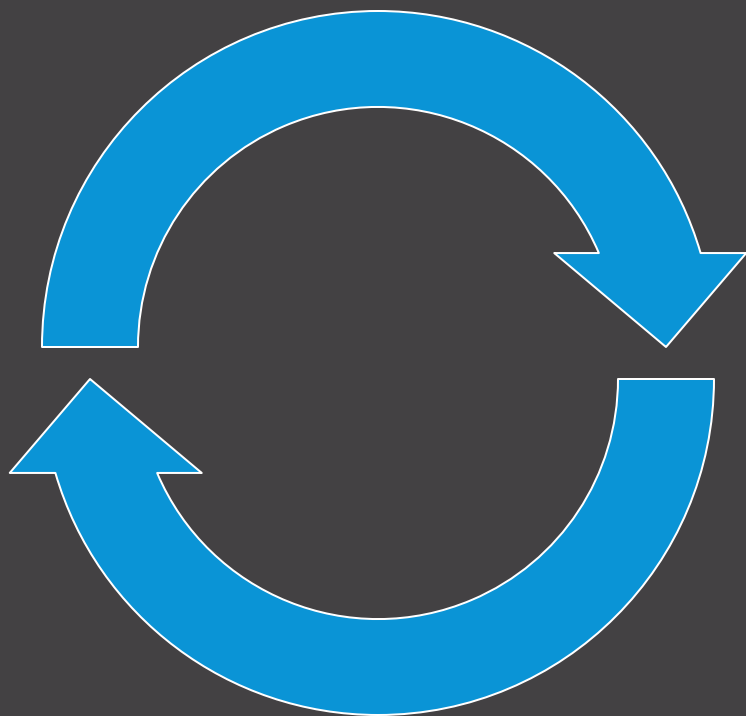

Repita,
Repita

Perguntas Frequentes

Perguntas Frequentes

Itens ordenados pelo Product Owner são bacanas,
mas o que acontece quando eu tenho
funcionalidades que precisam ser completadas
antes de outras?

Perguntas Frequentes

O que acontece quando o Product Owner aparece com um novo requisito e não conseguimos encaixá-lo no sprint atual?

Perguntas Frequentes

O que acontece se já estivermos no último sprint previsto e o Product Owner aparece com uma nova funcionalidade?

Perguntas Frequentes

Não seria melhor adicionar termos técnicos e algumas idéias da equipe nas histórias do usuário para torná-las mais úteis para todos?

Perguntas Frequentes

E se eu atingir o fim do sprint e não tiver nada para
exibir para o Product Owner?

Perguntas Frequentes

Qual deve ser o tamanho de uma tarefa?

Perguntas Frequentes

O que acontece se eu descobrir uma grande tarefa ausente?

Perguntas Frequentes


Uma questão importante e que tomará tempo para ser discutida surgiu no Daily Scrum. Devemos aumentar o time-box para 1h para resolver o problema?

Perguntas Frequentes



O Scrum diário deve acontecer realmente todos os dias?

Referências

Ken Schwaber

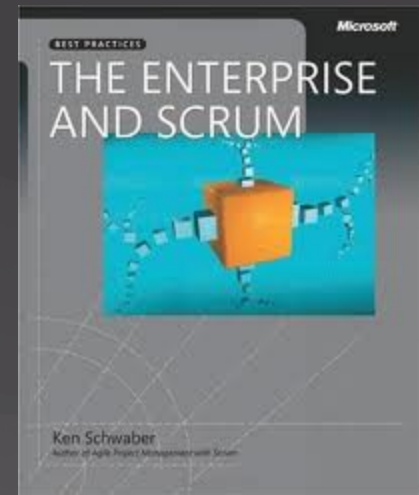

Mike Cohn

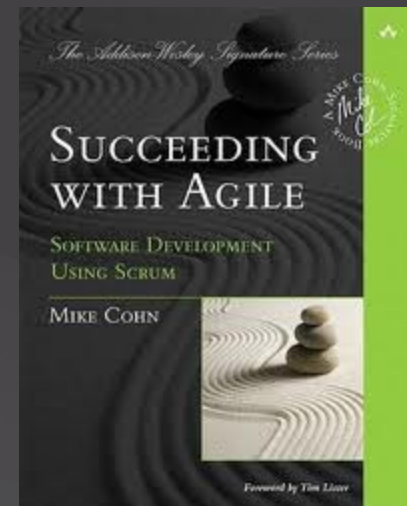



Sites Importantes

Manifesto ágil - <http://agilemanifesto.org/>

Agile Alliance - <http://www.agilealliance.org/>

Scrum Alliance - <http://www.scrumalliance.org/>



Sobre estes Slides

Template e figuras destes slides usados a partir de apresentações de Scrum presentes em <http://www.slideshare.net>

Traduções Utilizadas

- Release Plan - Plano de Liberações
- Sprint Review – Revisão do Sprint
- Sprint Retrospective – Retrospectiva do Sprint
- Daily Scrum – Reunião Diária
- Sprint Planning – Planejamento do Sprint
- User Stories – Histórias de Usuário
- Story Points – Pontos de História

Termos não traduzidos

- Business Case

Simulado

Obrigado !
